

ОТЧЕТ  
об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект:

муниципальное образование «Город Новочеркасск».

2. Наименование инициативного проекта:

капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ №32 по адресу: Ростовская обл., г.Новочеркасск ул. С.В. Мацоты,38.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта реализован.  
(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 01.07.2024г. по 23.07.2024г.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен нет

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока \_\_\_\_\_.

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта *	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу **
1	2	3	4
1.	«Капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ №32 по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. С. В. Мацоты, 38»	2 923 ,90	ООО «Валькирия»
	Итого	2 923 ,90	

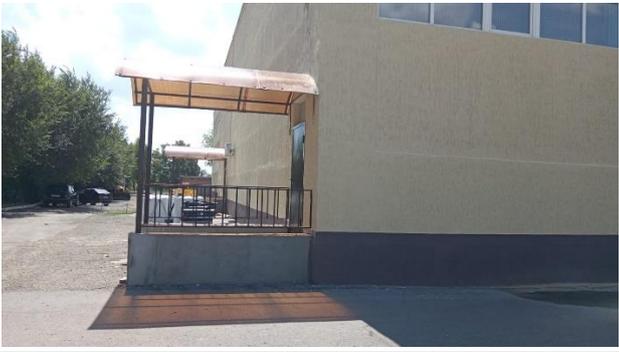
\*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

\*\*В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	2 923 ,90	100	2 923 ,90	100

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
объем средств областного бюджета	1 889,40	64,6	1 889,40	64,6
объем собственных средств местного бюджета	-	-	-	-
объем инициативных платежей физических лиц	777,90	24,8	777,90	24,8
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	256,60	10,6	256,60	10,6
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта				

## 5. Фотоматериалы\*

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
1.		
2.		
3.		

4.



\* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятые с одного и того же ракурса.
